



Broj: 01-02-387/19-4
Ilidža, 31.01.2019.godine

Na osnovu člana 88. stav (3) Statuta općine Ilidža - Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/10, 18/16)), prilikom razmatranja Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja lokalnih cesta za period 2019. – 2021.godine, Općinsko vijeće Ilidža na 22.redovnoj sjednici održanoj dana 31.01.2019.godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Akcioni plan za realizaciju Strategije razvoja lokalnih cesta za period 2019 – 2021.godine i isti je sastavni dio ovog Zaključka.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

PREDSJEDAVAJUĆI

Muhamed Omerović

DOSTAVLJENO:

1. Općinski načelnik
2. Služba za finansije
3. Služba za razvoj, investicije i komunalne poslove
4. Služba za imov.pravn., stam.geod.poslove i kat.nekretnina
5. Služba za inspekcijski nadzor
6. Služba za prostorno uređenje
7. Str.služba za koordinaciju rada MZ-a
8. Savjetima MZ-a putem Str.službe za koordinaciju rada MZ-a
9. Za objavu „SNKS“
10. Evidencija
11. a/a



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA
OPĆINSKI NAČELNIK
SLUŽBA ZA RAZVOJ, KOMUNALNE
POSLOVE I PUTEVE



BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
SARAJEVO CANTON - MUNICIPALITY OF ILIDŽA
MUNICIPALITY MAYOR
DEVELOPMENT, UTILITY SERVICES
AND ROADS DEPARTMENT

AKCIONI PLAN
ZA REALIZACIJU STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNIH CESTA
(2019. - 2021.)
(III)

OPĆINSKI NAČELNIK:

Prof.dr.Senaid Memić

Ilidža, januar 2019. godine



OPĆINA ILIDŽA
OPĆINSKI NAČELNIK
SLUŽBA ZA RAZVOJ, KOMUNALNE POSLOVE I PUTEVE

PROJEKAT:

STRATEGIJA RAZVOJA LOKALNIH CESTA ZA PERIOD 2015. - 2025. GODINE

DOKUMENT: Akcioni plan za realizaciju strategije razvoja lokalnih cesta za period 2019. - 2021. godine

PERIOD VAŽENJA: Akcioni plan se donosi za period od 2 (dvije) godine (2019. i 2020. godina)

NAMJENA DOKUMENTA: Akcioni plan za realizaciju strategije razvoja lokalnih cesta je dokument koji sadrži konkretne akcije za razvoj lokalnih cesta, za period od 2019.-2020. godine.

STATUS: Finalna verzija

VERZIJA: 1.0

UREDNICI: Mirsad Čaušević, dipl.ing.arh., Zlatko Pilavac, dipl.pravnik, Meho Detlić, MA-dipl.ing.saob. i kom., Nedim Botulja, MA-dipl.ing.saob. i kom., Husein Tursunović, dipl.ing.građ., i Elmedin Dedović, dipl.ing.saobr. i kom.

SADRŽAJ

UVOD.....	3
1. NAČIN I POSTUPAK PROVOĐENJA AKCIJA NA REALIZACIJI STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNIH CESTA....	4
2. FINANSIJSKA SREDSTVA.....	5
3. STEPEN REALIZACIJE STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNIH CESTA ZA PERIOD 2015.-2025. GODINE.....	9
4. OSNOVNI ELEMENTI AKCIONOG PLANA ZA PERIOD OD 2019.-2021. GODINE	10
4.1 PRIORITETI GRAĐENJA ZA PERIOD OD 2019. DO 2021. GODINE	11
POPIS SLIKA	23
POPIS TABELA	24

UVOD

Strategijom razvoja lokalnih cesta za period 2015.-2025. godine, utvrđeni su osnovni ciljevi i pravci za poboljšanje stanja lokalnih cesta. Navedena Strategija predstavlja dokument koji sadrži viziju, misiju, ciljeve, kriterije i prioritete razvoja i građenja kao i kriterije realizacije strategije. Da bi se omogućila adekvatna realizacija navedenog dokumenta, neophodno je pristupiti izradi akcionog plana. Akcioni plan za realizaciju strategije razvoja lokalnih cesta predstavlja specifikaciju mjera i akcija, u cilju realizacije ciljeva iz dokumenta "Strategija razvoja lokalnih cesta za period 2015.-2025. godine. Aktivnosti predviđene akcionim planom za implementaciju Strategije razvoja lokalnih cesta za period 2015.-2025. godine, doprinjet će razvoju funkcionalnog saobraćajnog sistema na području Općine Ilidža, koji treba da obezbijedi povećanje kapaciteta saobraćajnica i očekivanog nivoa usluge.

1. NAČIN I POSTUPAK PROVOĐENJA AKCIJA NA REALIZACIJI STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNIH CESTA

Akcioni plan razvoja lokalnih cesta je dokument koji daje specifikaciju konkretnih akcija za razvoj lokalnih cesta za period 2015.-2025. godine. Akcioni plan je baziran na strateškim smjernicama datim u dokumentu Strategija razvoja lokalnih cesta za period 2015.-2025. godine.

Akcionim planom predviđeni su osnovni i specifični ciljevi, ali isto tako će se voditi računa o ciljevima i očekivanim rezultatima za svaku pojedinačnu aktivnost, gdje će se od samog početka ugraditi mehanizmi praćenja po fazama implementacije, efektivna primjena na terenu te usklađivanje i korekcija aktivnosti u odnosu na stanje na terenu.

Akcionim planom će biti predstavljene aktivnosti i mjere za realizaciju strategije razvoja lokalnih cesta kojom je obuhvaćeno rekonstrukcija 88,83 km lokalnih cesta, izgraditi 12,6 km lokalnih cesta, 80,92 km pješačkih staza, 9 mostova, 3 kružna toka.

r.b.	Naziv mjesne zajednice	Dužina saobraćajnica	Dužina pješačkih staza
1.	MZ Rakovica	13.890 m	12.725 m
2.	MZ Blažuj	13.620 m	10.025 m
3.	MZ Vrelo Bosne	1.705 m	1.265 m
4.	MZ Osjek	9.885 m	10.900 m
5.	MZ Otes	4.995 m	5.025 m
6.	MZ Vreoca	3.170 m	3.000 m
7.	MZ Lužani	3.655 m	7.310 m
8.	MZ Hrasnica II	7.095 m	4.185 m
9.	MZ Hrasnica I	3.580 m	2.170 m
10.	MZ Sokolović Kolonija	5.775 m	6.440 m
11.	MZ Butmir	4.955 m	5.005 m
12.	MZ Donji Kotorac	1.455 m	1.455 m
13.	MZ Ilidža Centar	2.010 m	3.540 m
14.	MZ Stup II	2.115 m	2.235 m
15.	MZ Stupsko brdo	890 m	640 m
16.	MZ Stup	5.005 m	5.005 m
17.	Igmanska cesta-ratni put	17.630 m	
UKUPNO:		101.430 m	80.925 m

Tabela 1.0. Ukupna dužina saobraćajnica i pješačkih staza po mjesnim zajednicama

Pod izgradnjom cesta smatra se izgradnja cesta pretežno po novoj trasi.

Pod rekonstrukcijom cesta, smatraju se radovi na dijelu postojeće ceste kojim se mijenja njena temeljna karakteristika s ciljem povećanja kapaciteta ceste i razine usluge.

Dužina saobraćajnica i pješačkih staza koje će se graditi svake godine, zavisit će od raspoloživih budžetskih sredstava. Povećanjem budžetskih sredstava, direktno će se odraziti i na dužinu saobraćajnica i pješačkih staza koje će se graditi.

Polazna vrijednost budžetskih sredstava je 2.100.000,00 KM a predstavlja zbir procjenjenih sredstava koji pripadaju Direkciji za ceste, naknadama za upotrebu cesta za vozila pravnih lica i građana i drugo u iznosu od 1.700.000,00KM i iznosa od 400.000,00 KM od prirodnih pogodnosti-rente.

r.b.	Naziv prihoda	Iznos
1.	Prihod od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste, naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica i građana i dr.	1.700.000,00 KM
2.	Prirodne pogodnosti-rente	400.000,00 KM
UKUPNO:		2.100.000,00 KM

Tabela 1.1. Početna vrijednost budžetskih sredstava za 2015. godinu

2. FINANSIJSKA SREDSTVA

Financijska sredstva za realizaciju Strategije, biće obezbjeđena iz izvora finansiranja predstavljenih u Strategiji razvoja lokalnih cesta za period 2015.-2025. godine, a ista će se kroz Budžet Općine Ilidža dodijeliti u ovu svrhu.


Analizom saobraćajnica i pješačkih staza iz Strategije, koje je neophodno rekonstruisati odnosno izgraditi, a uzimajući u obzir trenutne cijene i sistem građenja, dobili smo pretpostavljenu vrijednost koštanja radova za realizaciju naprijed navedenih radova.

Tabelarni prikaz pretpostavljene vrijednosti radova, za svaku zonu odnosno mjesnu zajednicu pojedinačno, prikazan je u sljedećoj tabeli.

r.b.	ZONA/MJESNA ZAJEDNICA	VRIJEDNOST KOŠTANJA
1.	ZONA 1 (MZ RAKOVICA)	3.911.600,00 KM
2.	ZONA 2 (MZ BLAŽUJ)	3.534.510,00 KM
3.	ZONA 3 (MZ VRELO BOSNE)	511.885,00 KM
4.	ZONA 4 (MZ OSJEK)	2.336.852,96 KM
5.	ZONA 5 (MZ OTES)	2.621.655,00 KM
6.	ZONA 6 (MZ VREOCA)	952.460,00 KM
7.	ZONA 7 (MZ LUŽANI)	1.597.200,00 KM
8.	ZONA 8 (MZ HRASNICA II)	1.193.875,00 KM
9.	ZONA 9 (MZ HRASNICA I)	3.141.105,00 KM
10.	ZONA 10 (MZ SOKOLOVIĆ KOLONIJA)	2.234.320,00 KM
11.	ZONA 11 (MZ BUTMIR)	1.327.875,00 KM
12.	ZONA 12 (MZ DONJI KOTORAC)	449.595,00 KM
13.	ZONA 13 (MZ ILIDŽA CENTAR)	

		1.994.400,00 KM
14.	ZONA 14 (MZ STUP II)	653.435,00 KM
15.	ZONA 15 (MZ STUPSKO BRDO)	164.890,00 KM
16.	ZONA 16 (MZ STUP)	1.546.545,00 KM
17.	HRASNIČKA CESTA ¹	5.945.100,00 KM
UKUPNO :		34.117.302,96 KM

Tabela 2.0. Pretpostavljena vrijednost građevinskih radova po zonama/mjesnim zajednicama

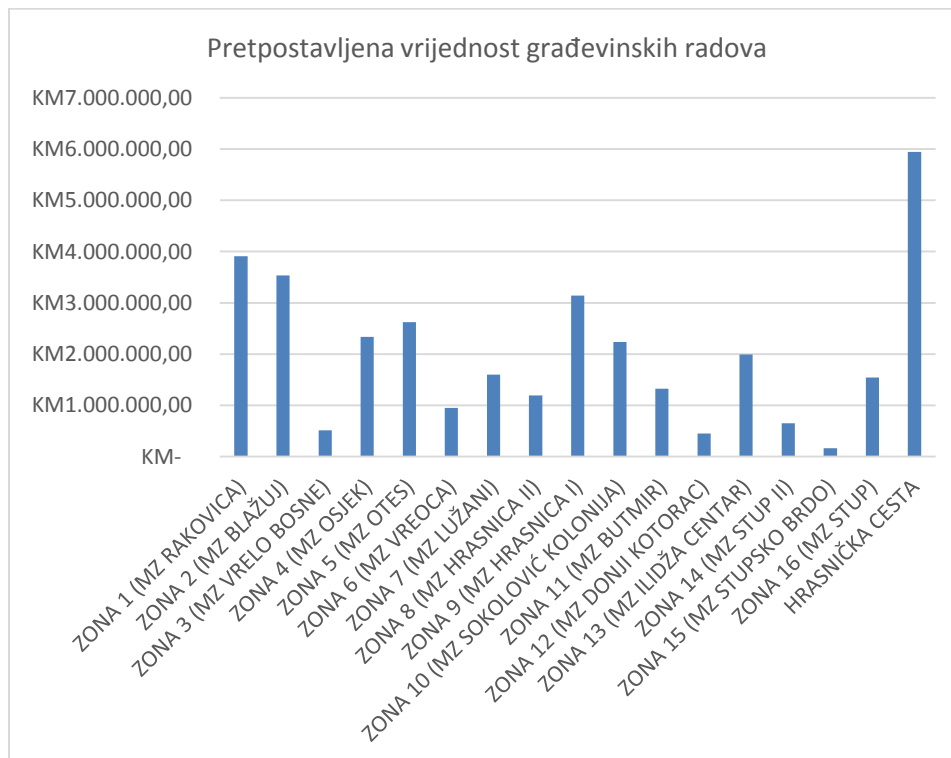

Slika 2.0. Pretpostavljena vrijednost građevinskih radova po zonama/mjesnim zajednicama


Napominjemo da se pretpostavljena vrijednost radova odnosi samo na građevinske radove i troškova projektovanja, bez imovinsko pravnih troškova.

U narednoj tabeli prikazano je povećanje budžetskih sredstava za svaku godinu.

¹ Hrasnička cesta se proteže kroz dvije mjesne zajednice (Sokolović Kolonija i Hrasnica I) pa je zbog toga izdvojena kao poseban projekat.

r.b.	godina	Postotak povećanja sredstava u odnosu prethodnu godinu	Budžetska sredstva
1.	2015.	-	2.100.000,00 KM
2.	2016.	10,4 %	2.318.400,00 KM
3.	2017.	10,4 %	2.559.513,60 KM
4.	2018.	10,4 %	2.825.703,01 KM
5.	2019.	10,4 %	3.119.576,13 KM
6.	2020.	10,4 %	3.444.012,05 KM
7.	2021.	10,4 %	3.802.189,30 KM
8.	2022.	10,4 %	4.197.616,98 KM
9.	2023.	10,4 %	4.634.169,15 KM
10.	2024.	10,4 %	5.116.122,74 KM
UKUPNO:			34.117.302,96 KM

Tabela 2.1. Povećanje budžetskih sredstava za period 10 godina

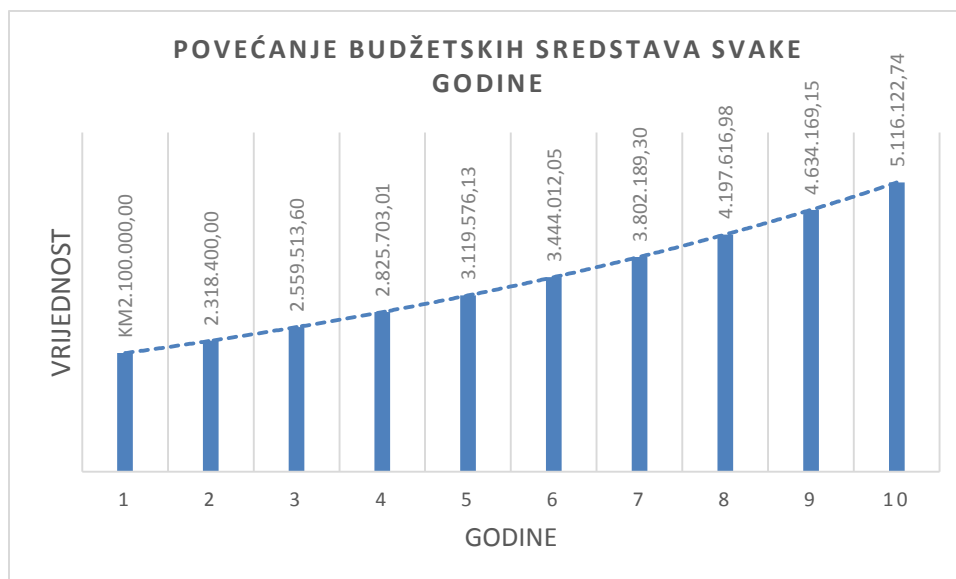

Slika 2.1. Povećanje budžetskih sredstava za period 10 godina


Vrijednost budžetskih sredstava u svakoj narednoj godini biće povećana za 10,4% u odnosu na vrijednost iz prethodne godine.

Zavisnost između pretpostavljenih budžetskih sredstava i realizacije Strategije predstavljena je tabelarno i grafički u nastavku.

r.b.	Godina	Postotak povećanja budžetskih sredstava	Budžetska sredstva	Realizacija strategije u postocima
1.	2015.	-	2.100.000,00 KM	6,16

2.	2016.	10,4 %	2.318.400,00 KM	12,95
3.	2017.	10,4 %	2.559.513,60 KM	20,45
4.	2018.	10,4 %	2.825.703,01 KM	28,74
5.	2019.	10,4 %	3.119.576,13 KM	37,88
6.	2020.	10,4 %	3.444.012,05 KM	47,97
7.	2021.	10,4 %	3.802.189,30 KM	59,12
8.	2022.	10,4 %	4.197.616,98 KM	71,42
9.	2023.	10,4 %	4.634.169,15 KM	85,00
10.	2024.	10,4 %	5.116.122,74 KM	100,00

Tabela 2.2. Odnos povećanja budžetskih sredstava i postotka realizacije strategije

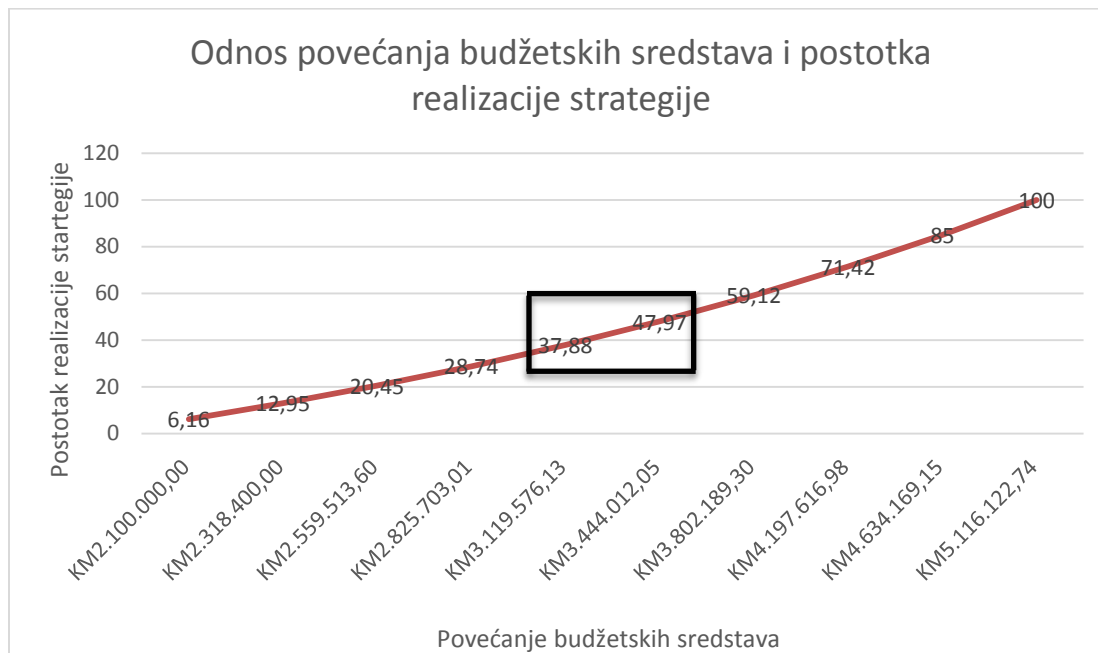


Slika 2.2. Odnos povećanja budžetskih sredstava i postotka realizacije strategije

Na samom početku, za svaku godinu izvršiti ćemo odabir saobraćajnica i pješačkih staza koje će se graditi odnosno rekonstruisati za period od 2 (dvije godine) u zavisnosti od raspoloživih budžetskih sredstava. Odabir saobraćajnica i pješačkih staza koje će se graditi odnosno rekonstruisati, provodit će se u skladu sa kriterijima i prioritetima građenja koji su detaljno opisani u Strategiji.

Algoritam provođenja akcija i mjera za navedene radove prikazan je u nastavku.

Analiza stanja na terenu i
prikupljanje relevantnih
podataka



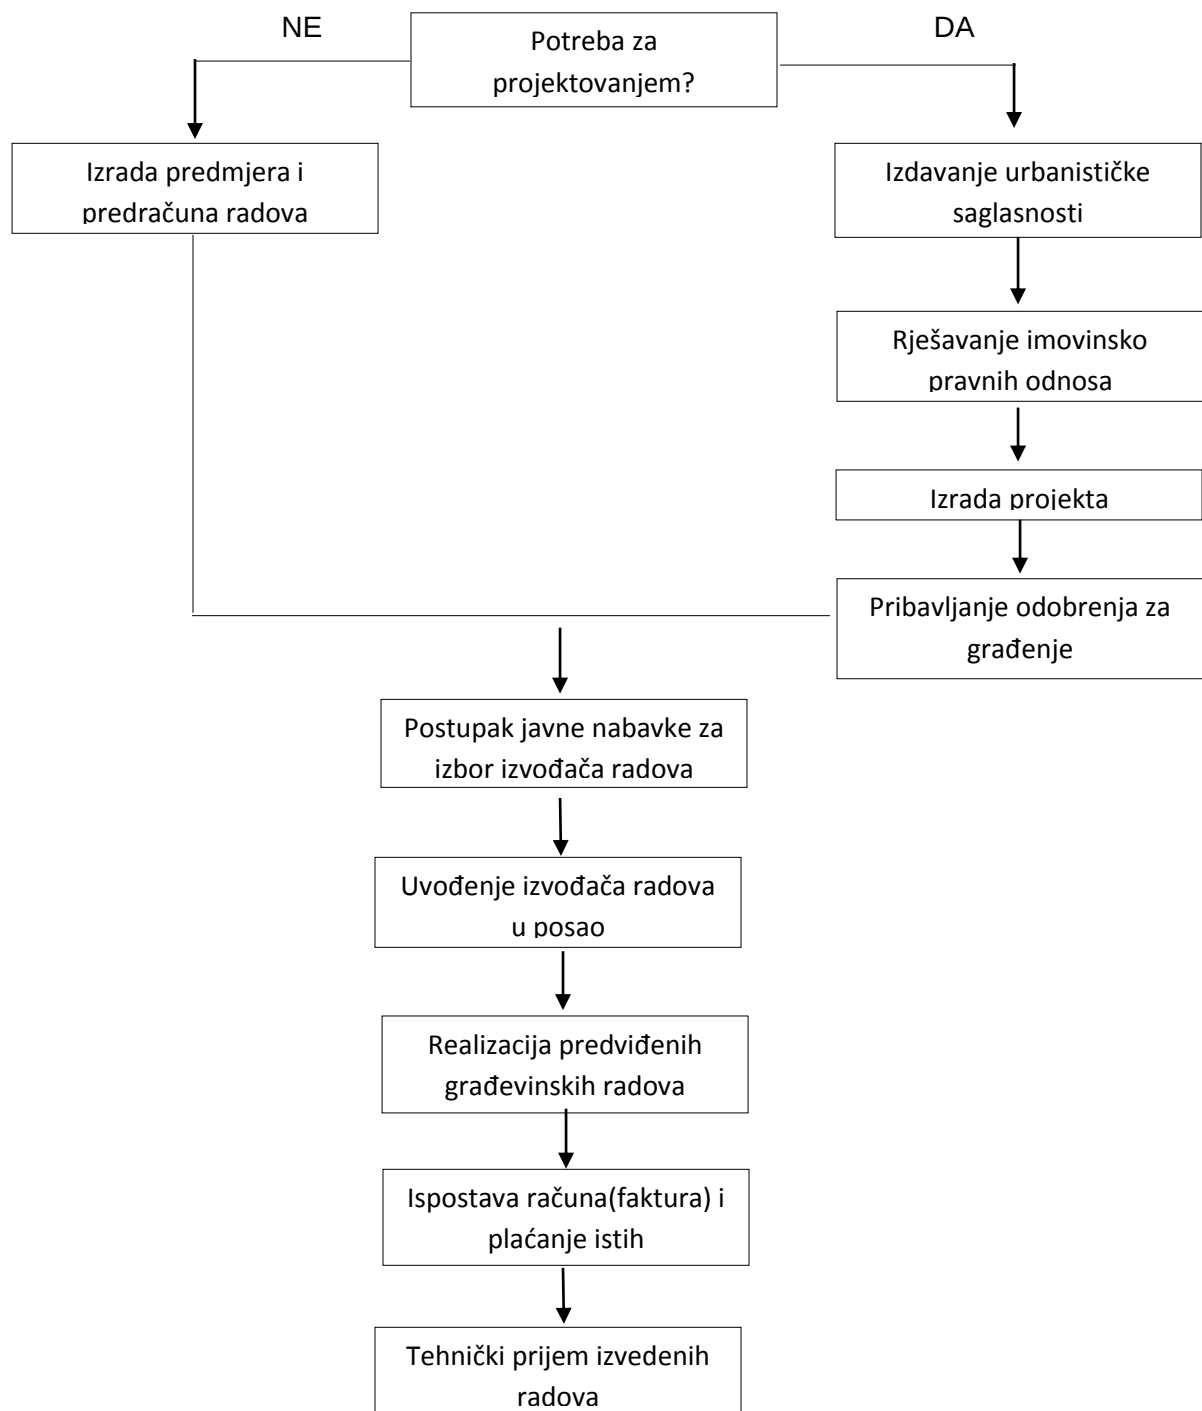

Slika 2.3. Algoritam provođenja mjera i akcija


3. STEPEN REALIZACIJE STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNIH CESTA ZA PERIOD 2015.-2025. GODINE

Akcionim planom za realizaciju Strategije razvoja lokalnih cesta za period od 2019.-2021. godine, predviđena su finansijska sredstva u iznosu od 6.563.588,18 KM, u sklopu čega je predviđena rekonstrukcija 11.48 km saobraćajnica te izgradnja 16,065 km pješačkih staza.

Budžetskim sredstvima iz 2015. godine i 2016. godine izdvojeno je 3.558.255,52 KM za rekonstrukciju i izgradnju predmetnih saobraćajnica i pješačkih staza, što iznosi 80% od predviđenih budžetskih sredstava

Budžetskim sredstvima iz 2017. godine i 2018. godine izdvojeno je 4.744.949,68 KM za rekonstrukciju i izgradnju predmetnih saobraćajnica i pješačkih staza, što iznosi 88,11% od predviđenih budžetskih sredstava.

Postotak realizacije Strategije razvoja lokalnih cesta za period od 2015.-2025. godine prikazan je na sljedećoj slici.

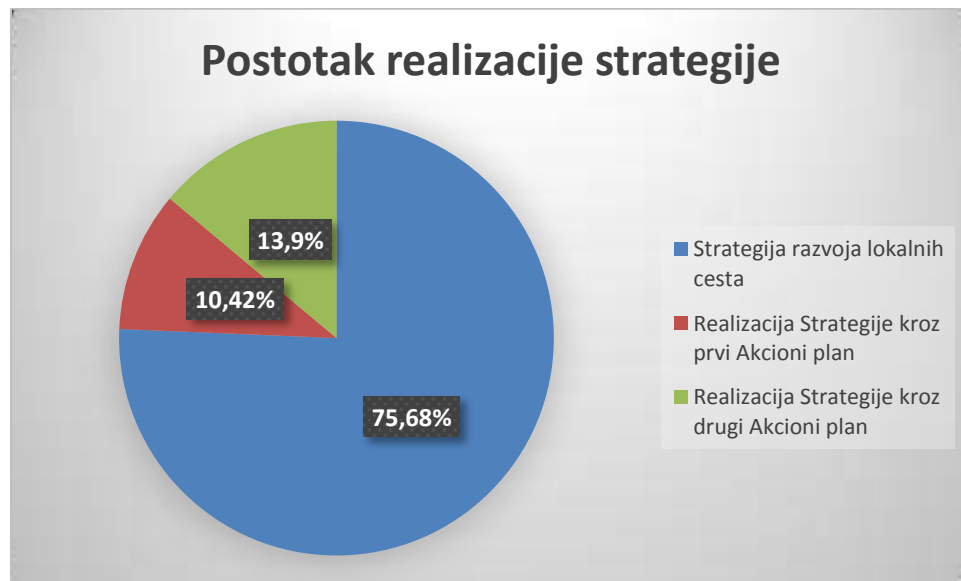

Slika 3.0. Postotak realizacije strategije

4. OSNOVNI ELEMENTI AKCIONOG PLANA ZA PERIOD OD 2019.-2021. GODINE

Akcioni plan, kao dokument realizacije strategije razvoja lokalnih cesta za period od 2015.-2025. godine, biće predstavljen tabelarno a sastoji se od sljedećih elemenata:

- Aktivnost;
- Nosilac aktivnosti;
- Rok za realizaciju;
- Indikator uspjeha;
- Odgovorna služba;
- Finansijska vrijednost;

Aktivnost, kao element akcionog plana, se odnosi na opis određenih poslova i akcija koje je neophodno poduzimati tokom određenog perioda. U ovom dijelu, detaljno se opisuje određena radnja u cilju realizacije određenog cilja.

Za realizaciju strategije biće neophodno poduzimanje mjera i akcija iz različitih Službi, pa će shodno tome u rubrici "Nosilac aktivnosti" biti definisane Službe koje će provoditi određene aktivnosti za realizaciju Strategije.

Trajanje određenih aktivnosti biće određeno u rubrici "Rok za realizaciju".

Indikator uspjeha treba da pokaže napredak koji se ostvario implementacijom određenog cilja Strategije.

Zbog složenosti akcija i mjera za realizaciju Strategije, svaka Služba, koja provodi aktivnost iz svoje nadležnosti, će biti odgovorna za poduzete mjere i akcije. U rubrici „Odgovorna služba“ nalazit će se naziv službe koja je odgovorna za pojedine akcije.

Zbog različitog obima i količine radova, u rubrici „Finansijska vrijednost“ biće predstavljena pretpostavljena vrijednost radova za realizaciju određenih mjera i akcija.

Sa obzirom da se ovaj Akcioni plan odnosi na period od dvije godine, od 2019.-2021. godine, u nastavku će biti prikazane saobraćajnice i pješačke staze koje će se u tom periodu rekonstruisati odnosno izgraditi, po svakoj zoni posebno.

Napominjemo da će se izgradnja i rekonstrukcija pojedinih saobraćajnica i pješačkih staza izvoditi u fazama, a sve u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima i potrebom za izgradnjom i rekonstrukcijom. Što znači, da se u toku jedne godine ne mora izvršiti rekonstrukcija ili izgradnja saobraćajnice ili pješačke staze u punom gabaritu predviđenog Strategijom, nego samo onaj segment (dio) za koji, u predviđenom periodu gradnje postoji potreba i obezbjeđena budžetska sredstva.

4.1 PRIORITETI GRAĐENJA ZA PERIOD OD 2019. DO 2021. GODINE

U skladu sa pretpostavljenim budžetskim sredstvima za 2019. (3.119.576,13 KM) i 2020. (3.444.012,05 KM) zbirne sume 6.563.588,18 KM. U nastavku su tabelarno i grafički prikazane saobraćajnice, pješačke staze i mostovi koji će se graditi za period od 2019. do 2021. godine.

Zelenom bojom prikazane su saobraćajnice i pješačke staze koje će se graditi u naredne dvije godine.

ZONA 1. (MZ RAKOVICA)

R.B.	Naziv saobraćajnica	Dužina	Širina			Opis
			kolovoza	pješačke staze	ukupna	
1.	Kakrinjski put (nastavak) (5.2 – 2)	865	5		5	Rekonstrukcija saobraćajnice
2.	Gornja mahala (5.2-	170	5		5	Rekonstrukcija saobraćajnice

	4)					
	Ukupno: 1.035,00 m					

Tabela 4.0. Prioriteti građenja zone 1 (MZ Rakovica)



Slika 4.0. Saobraćajnice Zone 1 (MZ Rakovica)

ZONA 2. (MZ BLAŽUJ)

R.B.	Naziv saobraćajnica	Dužina	Širina			Opis
			kolovoza	pješačke staze	ukupna	
1.	Kovačevac (5.3 – 4)	410	5		5	Rekonstrukcija i proširnje postojeće saobraćajnice
2.	od ul. Zujevska do ul. Vlakovo (pored Bosanke) (5.3-9)	625	6	1,5	9	Izgradnja saobraćajnice i mosta
3.	Krak ul. Vlakovo do ul. Remze Ahmetović (5.3-6)	400	6	1,5	7,5	Rekonstrukcija i proširnje postojeće saobraćajnice sa izgradnjom pješačke staze
Ukupno: 1.435,00 m						

Tabela 4.1. Prioriteti građenja zone 2 (MZ Blažuj)



Slika 4.1. Saobraćajnice Zone 2 (MZ Blažuj)


ZONA 4. (MZ OSJEK)

R.B.	Naziv saobraćajnica	Dužina	Širina			Opis
			kolovoza	pješačke staze	ukupna	
1.	Od novog mosta do ul. Plandište (5.5-1)	315	6	2x 1,5	9	Izgradnja saobraćajnice sa pješačkim stazama
2.	Osik (od ul. Plandište do novog mosta)-nastavak izgradnje pješačke staze (5.5-2)	1065		2x 1,5	1,5	Izgradnja pješačke staze
3.	Tukovi (5.5-3)	400	5,5		5,5	Izgradnja rampe na Zapadni prilaz gradu
4.	Naselje stara pruga (5.5-10)	1120	6	2x1,5	9	Rekonstrukcija postojeće asfaltirane saobraćajnice sa proširenjem saobraćajnice i izgradnjom pješačkih staza sa obje strane
Ukupno: 2.900,00 m						

Tabela 4.2. Prioriteti građenja zone 4 (MZ Osjek)

Napomena: Strategijom razvoja lokalnih cesta predviđena je rekonstrukcija postojeće asfaltirane saobraćajnice ul. Tukovi, sa proširenjem iste i izgradnjom pješačke staze, te izgradnja mosta preko rijeke Bosne do spoja sa ul. Lužansko polje. Funkcija ove saobraćajnice je povezivanje naselja Osjek sa zapadnim prilazom gradu i naseljem Vreoca.

Umjesto ove saobraćajnice, izgradit će se rampa na Zapadni prilaz gradu na lokaciji kod starog potputnjaka, čime će se ostvariti gore navedeni cilj (povezivanje naselja Osjek sa zapadnim prilazom gradu i naseljem Vreoca). Troškovi izgradnje rampe su znatno manji od izgradnje gore navedene saobraćajnice.

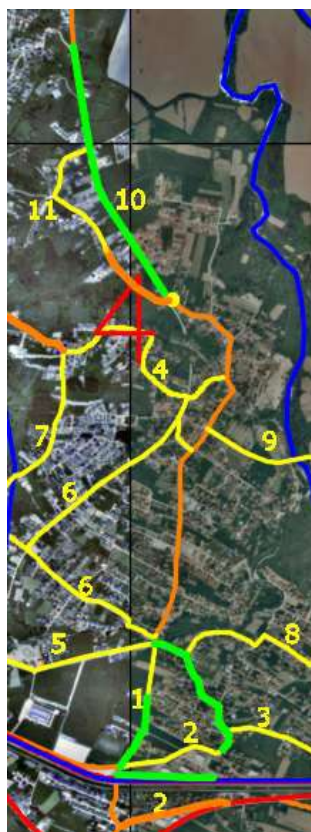

Slika 4.2. Saobraćajnice Zone 4 (MZ Osjek)

ZONA 5. (MZ OTES)

R.B.	Naziv saobraćajnica	Dužina	Širina			Opis
			kolovoza	pješačke staze	ukupna	
1.	od ul. Bosanskih Gazija do ul. Spomenik (5.6-1)	460	6	2x1,5	9	Izgradnja saobraćajnice sa pješačkim stazama
Ukupno: 460 m						

Tabela 4.3. Prioriteti građenja zone 5 (MZ Otes)



Slika 4.3. Saobraćajnice Zone 5 (MZ Otes)

ZONA 8. (MZ HRASNICA II)

R.B.	Naziv saobraćajnice	Dužina	Širina			Radovi
			kolovoza	pješačke staze	ukupna	
1.	Stari drum (5.9-3)	490	(5) 6	2x1,5	9	Proširenje saobraćajnice i izgradnja pješačke staze sa obje strane
Ukupno: 490 m						

Tabela 4.4. Prioriteti građenja zone 8 (MZ Hrasnica II)



Slika 4.4. Saobraćajnice Zone 8 (MZ Hrasnica II)

ZONA 9. (MZ HRASNICA I)

R.B.	Naziv saobraćajnice	Dužina	Širina			Radovi
			kolovoza	pješačke staze	ukupna	
1.	Šehitluci (5.10-1)	300	5,5	1,5	7	Proširenje saobraćajnice i izgradnja pješačke staze
Ukupno: 300 m						

Tabela 4.5. Prioriteti građenja zone 9 (MZ Hrasnica I)



Slika 4.5. Saobraćajnice Zone 9 (MZ Hrasnica I)

ZONA 12. (MZ DONJI KOTORAC)

R.B.	Naziv saobraćajnice	Dužina	Širina			Radovi
			kolovoza	pješačke staze	ukupna	
1.	Tuneli (5.13-2)	640	6	1,5	7,5	Rekonstrukcija postojeće saobraćajnice sa proširenjem saobraćajnice i izgradnjom pješačke staze
Ukupno: 640 m						

Tabela 4.6. Prioriteti građenja zone 12 (MZ Donji Kotorac)



Slika 4.6. Saobraćajnice Zone 12 (MZ Donji Kotorac)

ZONA 13. (MZ ILIDŽA CENTAR)

R.B.	Naziv saobraćajnica	Dužina	Širina			Opis
			kolovoza	pješačke staze	ukupna	
1.	Rustempašina (5.14-3)	235	6	2x2	10	Rehabilitacija saobraćajnice
2.	Ustanička-Ibrahima Ljubovića (5.14-4)	300	6	2x1,5	9	Izgradnja saobraćajnice sa pješačkim stazama sa obje strane
Ukupno: 535m						

Tabela 4.7. Prioriteti građenja zone 13 (MZ Ilidža Centar)



Slika 4.7. Saobraćajnice Zone 13 (MZ Ilidža Centar)

ZONA 14. (MZ STUP II)

R.B.	Naziv saobraćajnice	Dužina	Širina			Radovi
			kolovoza	pješačke staze	ukupna	
1.	Stupska (5.15-5)	330	6	2x1,5	9	Rekonstrukcija postojeće saobraćajnice sa proširenjem saobraćajnice i izgradnjom pješačkih staza
Ukupno: 330 m						

Tabela 4.8. Prioriteti građenja zone 14 (MZ Stup II)



Slika 4.8. Saobraćajnice Zone 14 (MZ Stup II)

ZONA 15. (MZ STUPSKO BRDO)

R.B.	Naziv saobraćajnice	Dužina	Širina			Radovi
			kolovoza	pješačke staze	ukupna	
1.	Dr. Kasima Begića (5.16-1)	530	6	1,5	7,5	Rekonstrukcija saobraćajnice i izgradnja pješačke staze
Ukupno: 530 m						

Tabela 4.9. Prioriteti građenja zone 15 (MZ Stupsko brdo)



Slika 4.9. Saobraćajnice Zone 15 (MZ Stupsko brdo)

ZONA 16. (MZ STUP)

R.B.	Naziv saobraćajnica	Dužina	Širina			Opis
			kolovoza	pješačke staze	ukupna	
1.	Mehe Porobića (5.17-4)	1080	6	1,5	7,5	Rekonstrukcija postojeće saobraćajnice sa proširenjem saobraćajnice i izgradnjom pješačke staze
Ukupno: 1.080,00 m						

Tabela 4.10. Prioriteti građenja zone 16 (MZ Stup)



Slika 4.10. Saobraćajnice Zone 16 (MZ Stup)

Ul. Hrasnička cesta

R.B.	Naziv saobraćajnice	Dužina	Širina			Opis
			kolovoza	pješačke staze	ukupna	
1.	Ul. Hrasnička cesta (5.18 – 1)	930	6	2x1,5	9	Izgradnja saobraćajnice i pješačkih staza, te rekonstrukcija kružnog toka
Ukupno: 930 m						

Tabela 4.11. Hrasnička cesta



Slika 4.11. Saobraćajnica Hrasnička cesta

Vanredno održavanje

Vanredno održavanje cesta obuhvata obimnije radove koji se izvode u cestovnom pojasu, i izvode se samo na osnovu tehničke dokumentacije i bez pribavljanja saglasnosti i druge dokumentacije prema Zakonu o prostornom uređenju.

Ovi radovi se obavljaju i zbog mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti saobraćaja.

U nastavku su prikazane saobraćajnice na kojima će se izvršiti vanredno održavanje, tačnije zamjena gornjeg stroja saobraćajnica. To su saobraćajnice koje svojim karakteristikama zadovoljavaju uslove saobraćaja, te ih je neophodno održavati u takvom stanju.

ZONA 7. (MZ LUŽANI)

R.B.	Naziv saobraćajnice	Dužina	Širina			Opis
			kolovoza	pješačke staze	ukupna	
1.	IV Viteške brigade	405	6	2x1,5	9	Zamjena gornjeg stroja saobraćajnice i pješačkih staza
Ukupno: 405 m						

Tabela 4.12. Prioritet sanacije ulica MZ Lužani



Slika 4.12. Sanacija ulica u MZ Lužani

ZONA 6. (MZ VREOCA)

R.B.	Naziv saobraćajnica	Dužina	Širina			Radovi
			kolovoza	pješačke staze	ukupna	
1.	Lužansko polje (5.7-4)	410	6		6	Rehabilitacija saobraćajnice
Ukupno: 435 m						

Tabela 4.13. Prioriteti građenja zone 6 (MZ Vreoca)



Slika 4.13. Saobraćajnice Zone 6 (MZ Vreoca)

Akcije, mjere i aktivnosti koje će se poduzimati, prikazane su u sljedećoj tabeli.

2019. i 2020. godina						
R.B.	AKTIVNOST	NOSILAC AKTIVNOSTI	VREMENSKI PERIOD	ODGOVORNA SLUŽBA	FINANSIJSKA SREDSTVA	INDIKATOR USPJEHA
1.	Analiza stanja na terenu i prikupljanje relevantnih podataka	Služba za razvoj, komunalne poslove i puteve	Od 01.02.-15.02.	Služba za razvoj, komunalne poslove i puteve	Vrijednost građevinskih radova za izgradnju saobraćajnica u 2017. i 2018. godini je: 5.385.216,61 KM	-povećanje kapaciteta postojećih saobraćajnica
2.	Izrada predmjera i predračuna radova	Služba za razvoj, komunalne poslove i puteve	Od 15.02.-01.03.	Služba za razvoj, komunalne poslove i puteve		- povećanje razine sigurnosti kretanja vozila i pješaka
3.	Izdavanje urbanističke saglasnosti	Služba za prostorno uređenje	Tokom cijelog perioda u godini, po potrebi	Služba za prostorno uređenje		-razvoj mreže lokalnih saobraćajnica
4.	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina	Tokom cijelog perioda u godini	Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina		-smanjenje vremena putovanja
5.	Izrada Projekata	Služba za razvoj, komunalne poslove i puteve	Tokom cijelog perioda u godini, po potrebi	Služba za razvoj, komunalne poslove i puteve		-povećanje nivoa usluge
6.	Izdavanje odobrenja za građenje	Služba za prostorno uređenje	Tokom cijelog perioda u godini, po potrebi	Služba za prostorno uređenje		-
7.	Izbor izvođača radova	Služba za razvoj, komunalne poslove i puteve - (komisija za javnu nabavku)	01.03.-01.04.	Komisija za javnu nabavku)		
8.	Izvođenje radova na terenu	Služba za razvoj, komunalne poslove i puteve	01.04.-15.11.	Služba za razvoj, komunalne poslove i puteve		
9.	Nadzor nad izvođenjem radova	Služba za razvoj, komunalne poslove i puteve	Tokom cijelog perioda izvođenja radova	Služba za razvoj, komunalne poslove i puteve		

10.	Plaćanje računa	Služba za finansije	Po okončanju radova	Služba za finansije		
11.	Tehnički prijem izvedenih radova	Služba za razvoj, komunalne poslove i puteve	Nakon realizacije radova i plaćanja računa	Služba za razvoj, komunalne poslove i puteve		

Tabela 4.14. Akcije, mjere i aktivnosti akcionog plana realizacije strategije od 2019.-2021. godine

Ukoliko se tokom određenog perioda ustanovi da određeni projekti ne mogu biti realizovani u predmetnom periodu, ovaj akcioni plan može pretrpiti izmjene uz saglasnost Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

POPIS SLIKA

Slika 2.0. Pretpostavljena vrijednost građevinskih radova po zonama/mjesnim zajednicama 6

Slika 2.1. Povećanje budžetskih sredstava za period 10 godina.....	7
Slika 2.2. Odnos povećanja budžetskih sredstava i postotka realizacije strategije.....	8
Slika 2.3. Algoritam provođenja mjera i akcija	9
Slika 3.0. Postotak realizacije strategije	10
Slika 4.0. Saobraćajnice Zone 1 (MZ Rakovica).....	12
Slika 4.1. Saobraćajnice Zone 2 (MZ Blažuj)	13
Slika 4.2. Saobraćajnice Zone 4 (MZ Osjek)	14
Slika 4.3. Saobraćajnice Zone 5 (MZ Otes)	15
Slika 4.4. Saobraćajnice Zone 8 (MZ Hrasnica II).....	15
Slika 4.5. Saobraćajnice Zone 9 (MZ Hrasnica I)	16
Slika 4.6. Saobraćajnice Zone 12 (MZ Donji Kotorac).....	17
Slika 4.7. Saobraćajnice Zone 13 (MZ Ilidža Centar).....	17
Slika 4.8. Saobraćajnice Zone 14 (MZ Stup II).....	18
Slika 4.9. Saobraćajnice Zone 15 (MZ Stupsko brdo)	19
Slika 4.10. Saobraćajnice Zone 16 (MZ Stup)	19
Slika 4.11. Saobraćajnica Hrasnička cesta	20
Slika 4.12. Sanacija ulica u MZ Lužani.....	21
Slika 4.13. Saobraćajnice Zone 6 (MZ Vreoca)	21

POPIS TABELA

Tabela 1.0. Ukupna dužina saobraćajnica i pješačkih staza po mjesnim zajednicama	4
Tabela 1.1. Početna vrijednost budžetskih sredstava za 2015. godinu.....	5
Tabela 2.0. Pretpostavljena vrijednost građevinskih radova po zonama/mjesnim zajednicama	6
Tabela 2.1. Povećanje budžetskih sredstava za period 10 godina	7
Tabela 2.2. Odnos povećanja budžetskih sredstava i postotka realizacije strategije	8
Tabela 4.0. Prioriteti građenja zone 1 (MZ Rakovica)	12
Tabela 4.1. Prioriteti građenja zone 2 (MZ Blažuj)	12
Tabela 4.2. Prioriteti građenja zone 4 (MZ Osjek).....	13
Tabela 4.3. Prioriteti građenja zone 5 (MZ Otes)	14
Tabela 4.4. Prioriteti građenja zone 8 (MZ Hrasnica II).....	15
Tabela 4.5. Prioriteti građenja zone 9 (MZ Hrasnica I).....	16
Tabela 4.6. Prioriteti građenja zone 12 (MZ Donji Kotorac).....	16
Tabela 4.7. Prioriteti građenja zone 13 (MZ Ilidža Centar)	17
Tabela 4.8. Prioriteti građenja zone 14 (MZ Stup II)	18
Tabela 4.9. Prioriteti građenja zone 15 (MZ Stupsko brdo)	18
Tabela 4.10. Prioriteti građenja zone 16 (MZ Stup)	19
Tabela 4.11. Hrasnička cesta	19
Tabela 4.12. Prioritet sanacije ulica MZ Lužani	20

Tabela 4.13. Prioriteti građenja zone 6 (MZ Vreoca)	21
Tabela 4.14. Akcije, mjere i aktivnosti akcionog plana realizacije strategije od 2019.-2021. godine	23
